ID	Actividad	Viene de	Sigue en	Inicio	Fin
1.4.16	Suministro de DC-01 y del lote 1	1.4.14, H1		08-03-27	09-03-27
1.4.2	Red de sitio y segmentación (25 sitios) · preparación (12)	inicio de M4		07-04-27	22-04-27
1.4.2	Red de sitio y segmentación (25 sitios) · intervención (14)	inicio de M4		08-04-27	23-04-27
1.4.2	Red de sitio y segmentación (25 sitios) · comprobación	inicio de M4	H3	24-04-27	07-05-27
1.4.11	Energía y climatización del centro de datos · preparación	inicio de M4		07-04-27	09-04-27
1.4.11	Energía y climatización del centro de datos · intervención	1.4.16, inicio de M4		10-04-27	15-04-27
1.4.11	Energía y climatización del centro de datos · comprobación	inicio de M4	H3	16-04-27	19-04-27
1.4.12	Seguridad física del centro de datos · preparación	inicio de M4		07-04-27	08-04-27
1.4.12	Seguridad física del centro de datos · intervención	1.4.16, inicio de M4		09-04-27	11-04-27
1.4.12	Seguridad física del centro de datos · comprobación	inicio de M4	H3	12-04-27	13-04-27
1.4.22	Equipamiento TI y redes de DC-01	1.4.16	H3	16-04-27	04-05-27

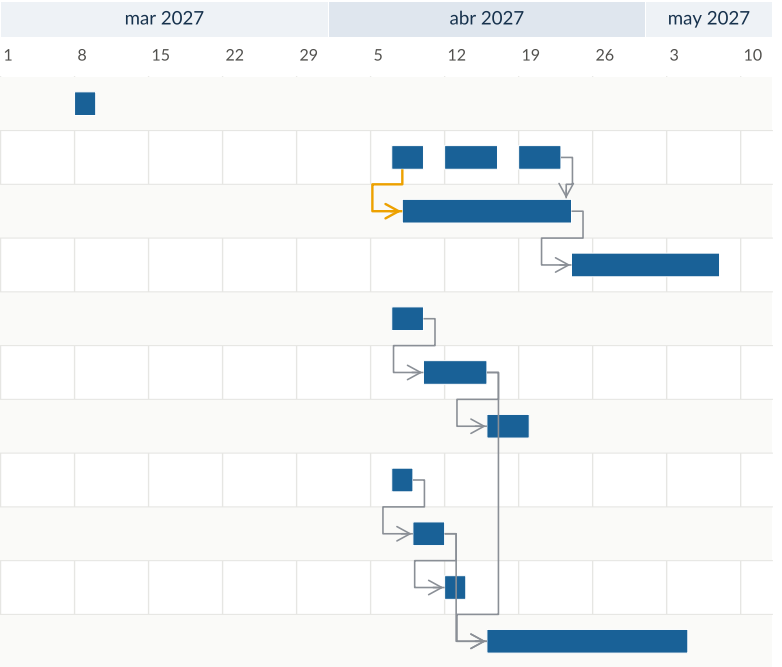

Actividad — Fin–inicio (FI) - - - Inicio–inicio (II) — Primer paquete que pasa a la fila siguiente
