Rama 1.5 · Desarrollo de software (lámina 2 de 3)

Etapa 1 · Etapa 2 · Marcha blanca · Operación · Actividades sin margen

Código	Paquete o cuenta de control	HH	Ventana	Margen
1.5.18	Punto de venta nuevo: registro y cobro …	932	M5–M6	5
1.5.19	Punto de venta con operación sin conexi…	932	M5–M6	3
1.5.20	Ventas del canal digital y enrutamiento…	466	M5–M6	2
1.5.21	Cobro con la tarjeta de la casa	233	M5–M6	2
1.5.22	Cálculo de la base de comisión	233	M13–M17	2
1.5.23	Entrega de la base de comisión al siste…	233	M13–M17	10
1.5.24	Revisión de la atribución de comisiones	233	M13–M17	10
1.5.25	Existencia declarada por el vendedor y …	466	M13–M17	10
1.5.26	Evaluación de vendedores y su consulta	932	M13–M17	10
1.5.27	Devoluciones, base de comisión y liquid…	699	M13–M17	10
1.5.28	Identificación del vendedor y separació…	466	M13–M17	10
1.5.29	Atención de garantía legal en el mesón,…	699	M13–M17	9
1.5.30	Devolución y aptitud de la unidad devue…	233	M13–M17	9
1.5.31	Resolución al consumidor y recuperación…	233	M13–M17	8
1.5.32	Consolidación de los registros de clien…	233	M13–M17	8
1.5.33	Puntos y sincronización con el sistema …	233	M13–M17	7
1.5.34	Segmentos y campañas con atributos come…	466	M13–M17	6

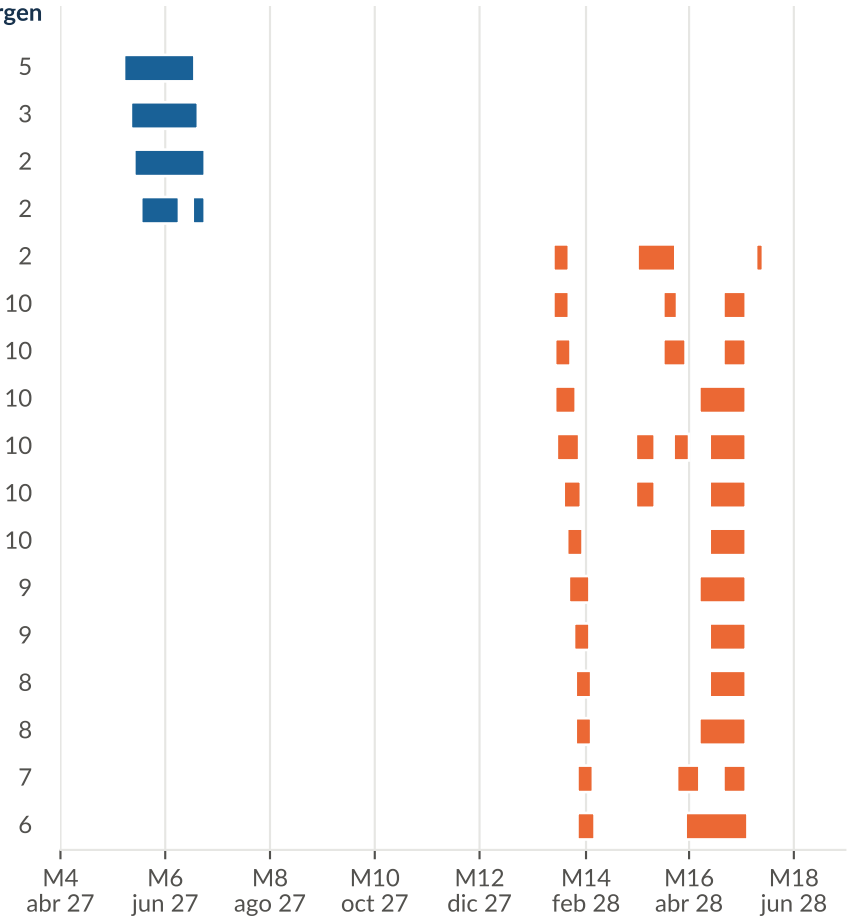

Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).
