Rama 1.11 · Implantación y despliegue

Código	Paquete o cuenta de control	HH	Ventana	Margen
1.11.1	Plan de implantación y reversión probado	101	M3–M3	204
1.11.2	Configuración y certificación de los si…	2.376	M12–M16	0
1.11.3	Plan de convivencia entre etapas	101	M10–M10	59
1.11.4	Piloto del punto de venta en tres tiend…	—	—	—

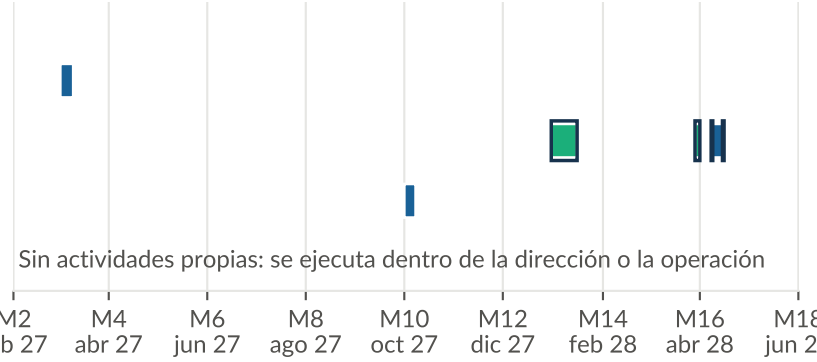

Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).
