## Rama 1.14 · Documentación, transferencia y reversibilidad

Etapa 1 · Etapa 2 · Marcha blanca · Operación · Actividades sin margen

| Código | Paquete o cuenta de control | HH | Ventana | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1.14.1 | Documentación técnica y funcional | — | — | — |
| 1.14.2 | Transferencia tecnológica (código y art… | 201 | M48–M49 | 163 |
| 1.14.3 | Base de conocimiento y manuales de oper… | 456 | M10–M22 | 13 |
| 1.14.4 | Plan de reversibilidad | 156 | M12–M24 | 16 |
| 1.14.5 | Acta de cierre y acompañamiento de reve… | 124 | M54–M54 | 56 |
| 1.14.6 | Informe de lecciones aprendidas | 50 | M56–M56 | 19 |
| 1.14.7 | Protocolo de aceptación de entregas | — | — | — |

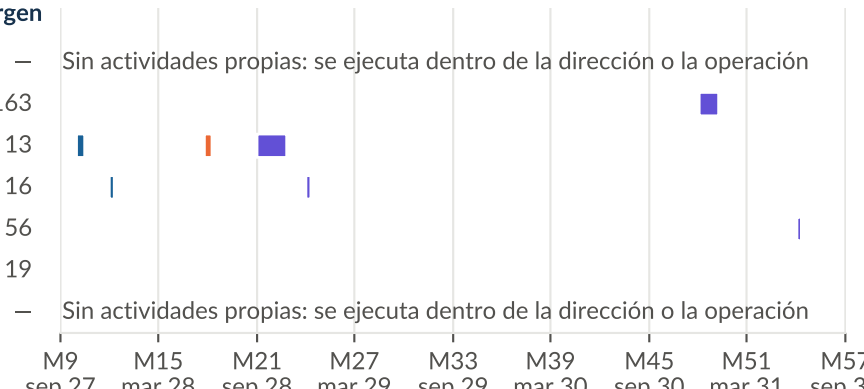


Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).
