Rama 1.2 · Levantamiento y línea base de alcance

Etapa 1 · Etapa 2 · Marcha blanca · Operación · Actividades sin margen

Código	Paquete o cuenta de control	HH	Ventana	Margen
1.2.1	Mapa de las 14 interfaces e inventario …	368	M1–M2	3
1.2.2	Levantamiento de procesos, reglas y vol…	915	M1–M1	0
1.2.3	Catálogo de requerimientos y matriz de …	252	M1–M1	0
1.2.4	Línea base de alcance por etapa	—	—	—
1.2.5	Estudio: etiquetas electrónicas de prec…	180	M2–M2	75
1.2.6	Estudio: sistema de almacenes de Concep…	163	M2–M2	96
1.2.7	Estudio: destino de las plataformas	228	M2–M2	65
1.2.8	Propuesta de criterios del cupo preapro…	81	M1–M1	5

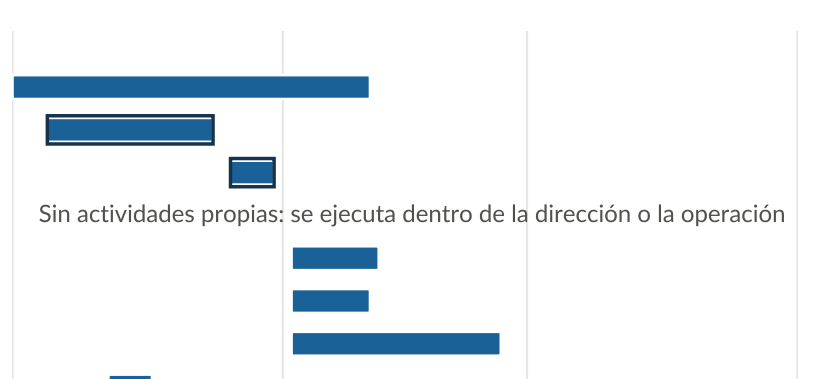

Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).
