Rama 1.7 · Migración y saneamiento de datos

Etapa 1 · Etapa 2 · Marcha blanca · Operación · Actividades sin margen

Código	Paquete o cuenta de control	HH	Ventana	Margen
1.7.1	Plan de migración con corte y retorno	131	M2–M2	59
1.7.2	Maestro de artículos saneado (268.000)	912	M4–M10	5
1.7.3	Corte de inventario en 24 instalaciones	1.216	M11–M13	0
1.7.4	Migración del histórico comercial	507	M10–M13	16
1.7.5	Migración de clientes, vendedores y liq…	244	M17–M19	15
1.7.6	Migración de la cartera viva (620.000)	1.267	M10–M19	0
1.7.7	Repositorio de datos históricos no migr…	456	M10–M13	0
1.7.8	Plan de retiro de la plataforma de 2011	127	M18–M18	12
1.7.9	Plataforma de 2011 fuera de servicio	101	M22–M22	10
1.7.10	Sistema central de 2009 retirado	132	M54–M55	19
1.7.11	Sustitución del punto de venta de 2014	—	—	—
1.7.12	Actas de compuerta por tramo de la cart…	—	—	—

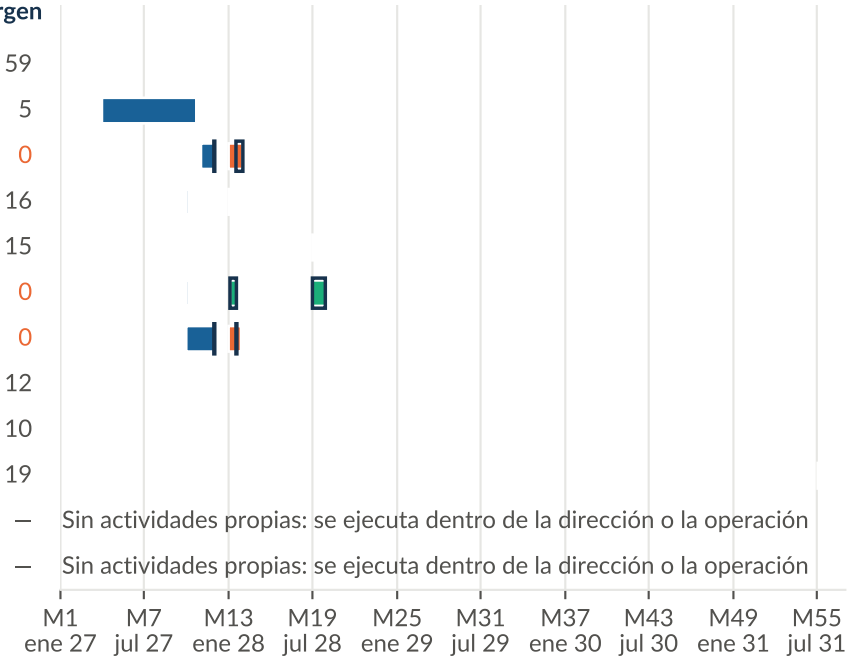

Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).
