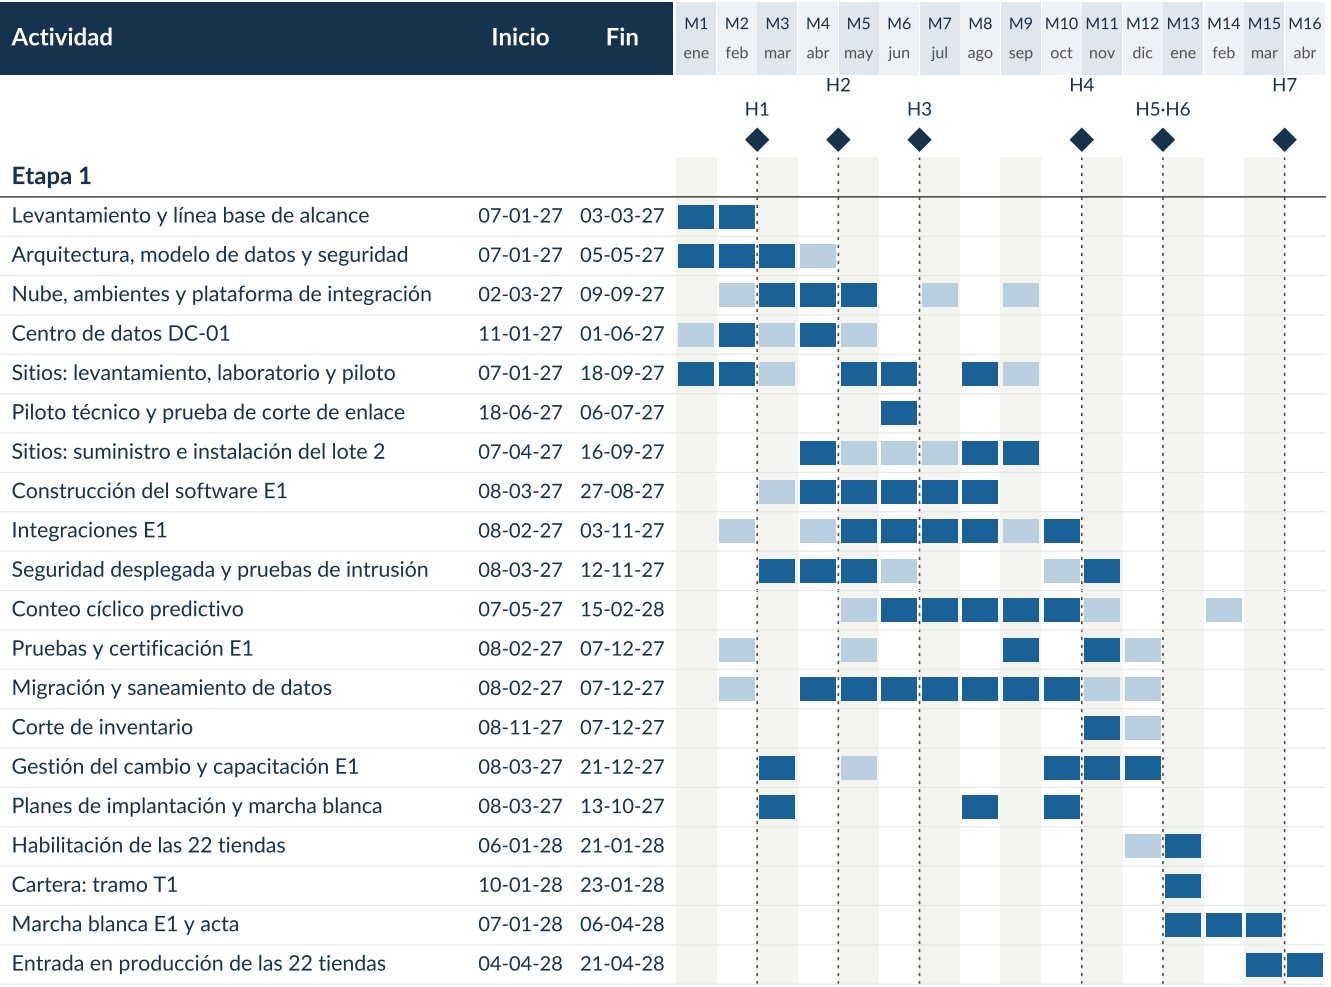
Actividad
Inicio
Fin
M1 ene
M2 feb
M3 mar
M4 abr
M5 may
M6 jun
M7 jul
M8 ago
M9 sep
M10 oct
M11 nov
M12 dic
M13 ene
M14 feb
M15 mar
M16 abr
H1
H2
H3
H4
H5·H6
H7
Etapa 1
Levantamiento y línea base de alcance 07-01-27 03-03-27
Arquitectura, modelo de datos y seguridad 07-01-27 05-05-27
Nube, ambientes y plataforma de integración 02-03-27 09-09-27
Centro de datos DC-01 11-01-27 01-06-27
Sitios: levantamiento, laboratorio y piloto 07-01-27 18-09-27
Piloto técnico y prueba de corte de enlace 18-06-27 06-07-27
Sitios: suministro e instalación del lote 2 07-04-27 16-09-27
Construcción del software E1 08-03-27 27-08-27
Integraciones E1 08-02-27 03-11-27
Seguridad desplegada y pruebas de intrusión 08-03-27 12-11-27
Conteo cíclico predictivo 07-05-27 15-02-28
Pruebas y certificación E1 08-02-27 07-12-27
Migración y saneamiento de datos 08-02-27 07-12-27
Corte de inventario 08-11-27 07-12-27
Gestión del cambio y capacitación E1 08-03-27 21-12-27
Planes de implantación y marcha blanca 08-03-27 13-10-27
Habilitación de las 22 tiendas 06-01-28 21-01-28
Cartera: tramo T1 10-01-28 23-01-28
Marcha blanca E1 y acta 07-01-28 06-04-28
Entrada en producción de las 22 tiendas 04-04-28 21-04-28
Meses con el trabajo principal (80 % de las horas)
Meses con trabajo menor
Hito del contrato (Formulario E-25)
