Actividad	Inicio	Fin
Versión candidata verificada (hito interno)	01-10-27	01-10-27
Certificación de integraciones con conciliación	07-10-27	03-11-27
Certificación específica (junto con la certificació…	08-11-27	11-11-27
Pruebas de desempeño, resiliencia y DR	08-11-27	11-11-27
Pruebas de intrusión y plan de remediación	08-11-27	12-11-27
H4 · Software E1 para pruebas	**07-11-27**	**07-11-27**
Aceptación de los 28 criterios del caso	22-11-27	03-12-27
Corte de inventario en 24 instalaciones	08-11-27	07-12-27
Capacitación ejecutada y certificada	07-10-27	21-12-27
Plan de reversibilidad	07-12-27	15-12-27
Revisión del cliente y reserva de subsanación	10-12-27	06-01-28
H5 · Certificación E1	**07-01-28**	**07-01-28**

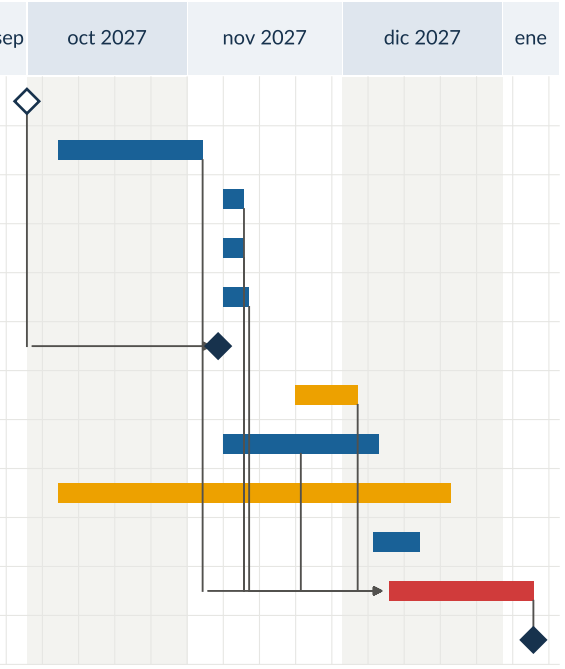

Ruta crítica · Holgura ≤ 10 días hábiles · Holgura > 10 días hábiles · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II)
