ID	Actividad	Viene de	Sigue en	Inicio	Fin
–	Continuidad del servicio de la Etapa 1 en producción			07-04-28	06-09-28
–	Revisión del cliente de la certificación E2			06-06-28	19-06-28
–	Reserva para subsanar observaciones E2			22-06-28	06-07-28
H10	**Certificación E2**		1.10.1.4, 1.10.1.7 y 6 más	**07-07-28**	**07-07-28**
H11	**Inicio de marcha blanca E2**		1.13.4, 1.7.6	**07-07-28**	**07-07-28**
1.12.5	Informe de la marcha blanca de la Etapa 2	inicio de M19		07-07-28	06-09-28
–	Cuatro últimas semanas de evidencia E2			10-08-28	06-09-28
–	Revisión progresiva del expediente E2			24-08-28	06-09-28
H12	**Producción E2 y aceptación**		1.15.6, 1.7.10, 1.7.9	**07-09-28**	**07-09-28**
–	Evidencia completa E2 (control)			07-09-28	07-09-28

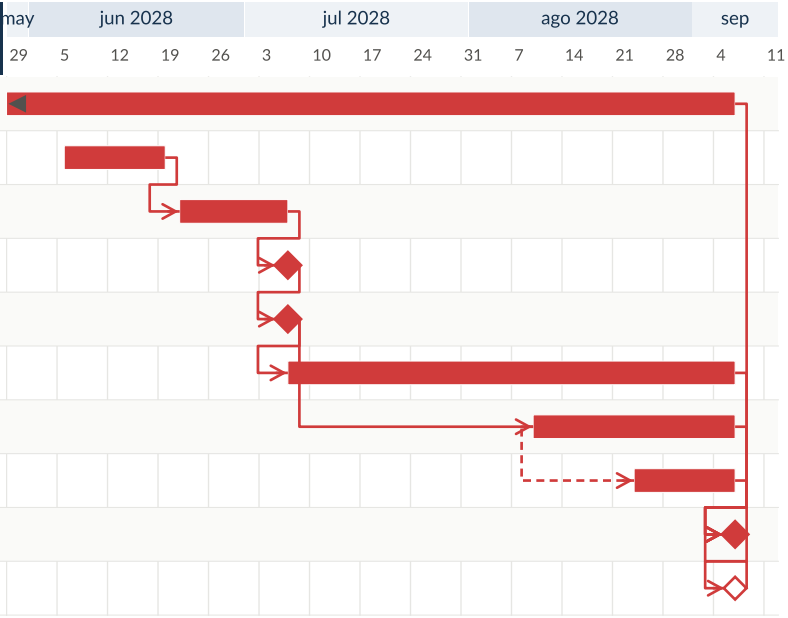

Ruta crítica ◆ Hito — Fin–inicio (FI) - - - Inicio–inicio (II)
