Actividad	Inicio	Fin
Revisión del cliente de la certificación E1	10-12-27	23-12-27
Reserva para subsanar observaciones	24-12-27	06-01-28
H5 · Certificación E1	07-01-28	07-01-28
H6 · Inicio de marcha blanca E1	07-01-28	07-01-28
Marcha blanca E1: operación supervisada	07-01-28	06-04-28
Cuatro últimas semanas de evidencia	10-03-28	06-04-28
Revisión progresiva del expediente	24-03-28	06-04-28
H7 · Producción E1	07-04-28	07-04-28
Viaje del equipo de acompañamiento	06-04-28	06-04-28
Entrada oficial de las 22 tiendas	07-04-28	07-04-28
Habilitación de las 22 tiendas (fecha fija)	06-01-28	21-01-28
Cartera: tramo T1 (fecha fija)	10-01-28	23-01-28

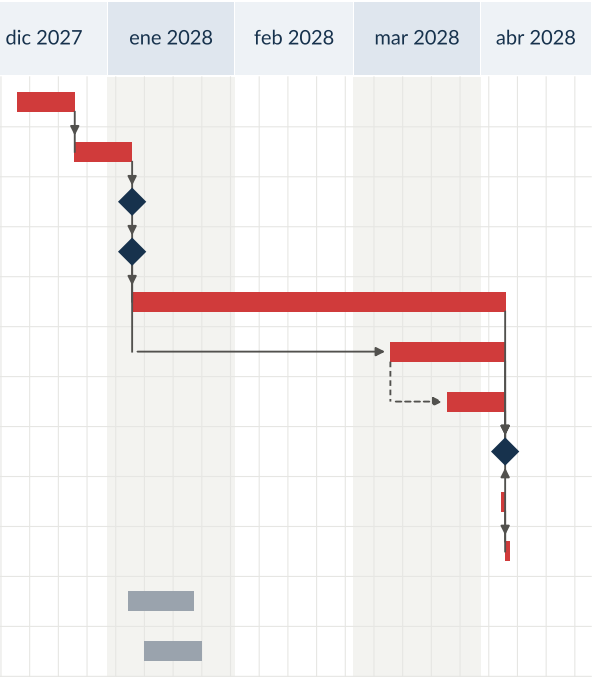

Ruta crítica (holgura 0) · Fecha fija, fuera de la ruta crítica · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II)
