| Actividad | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Especificación del modo desconectado de 24 h | 15-03-27 | 19-03-27 |
| Entorno de nube (IaC, subredes, etiquetado) | 08-03-27 | 31-03-27 |
| Ambientes dev/QA/preprod/prod/DR | 02-03-27 | 12-04-27 |
| Plataforma de integración y entrega continuas | 08-03-27 | 22-04-27 |
| Entornos dedicados de la Filial y del Control de cr… | 07-04-27 | 13-04-27 |
| Observabilidad unificada y catálogo de alertas | 07-04-27 | 10-05-27 |
| **H2 · Arquitectura aprobada** | **07-05-27** | **07-05-27** |
| Suministro de DC-01 y del lote 1 | 08-03-27 | 09-03-27 |
| Energía y climatización del centro de datos | 07-04-27 | 19-04-27 |
| Seguridad física del centro de datos | 07-04-27 | 13-04-27 |
| Equipamiento TI y redes de DC-01 | 16-04-27 | 04-05-27 |
| Red de sitio y segmentación (25 sitios) | 07-04-27 | 15-06-27 |
| Sitios piloto y laboratorio (1.4.15, 1.4.17, 1.4.23) | 02-06-27 | 17-06-27 |
| Prueba de corte de enlace de 24 h en el piloto | 18-06-27 | 06-07-27 |
| **H3 · Infraestructura y ambientes** | **07-07-27** | **07-07-27** |

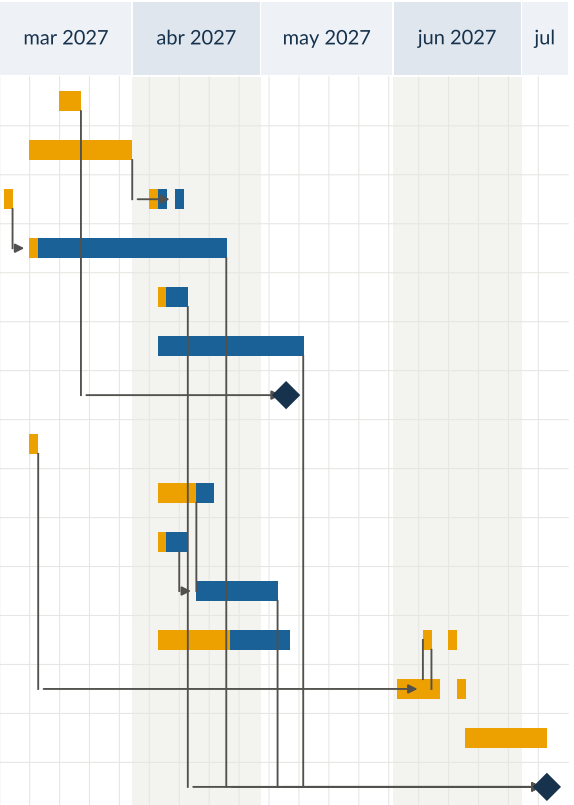


Holgura ≤ 10 días hábiles · Holgura > 10 días hábiles · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II)
