Actividad	Inicio	Fin
1.4.4 Ambientes dev/QA/preprod/prod/DR (5)	02-03-27	12-04-27
1.4.1 Entorno de nube (IaC, subredes, etiquetado)	08-03-27	31-03-27
1.4.6 Plataforma de integración y entrega continuas (2)	08-03-27	22-04-27
1.4.16 Suministro de DC-01 y del lote 1	08-03-27	09-03-27
1.3.5 Especificación del modo desconectado de 24 h	15-03-27	19-03-27
1.4.11 Energía y climatización del centro de datos · preparación	07-04-27	09-04-27
1.4.12 Seguridad física del centro de datos · preparación	07-04-27	08-04-27
1.4.2 Red de sitio y segmentación (25 sitios) · preparación (12)	07-04-27	22-04-27
1.4.3 Entornos dedicados de la Filial y del Control de cruces ·…	07-04-27	08-04-27
1.4.5 Observabilidad unificada y catálogo de alertas	07-04-27	10-05-27
1.4.2 Red de sitio y segmentación (25 sitios) · intervención (1…	08-04-27	23-04-27
1.4.12 Seguridad física del centro de datos · intervención	09-04-27	11-04-27
1.4.3 Entornos dedicados de la Filial y del Control de cruces ·…	09-04-27	11-04-27
1.4.11 Energía y climatización del centro de datos · intervenci…	10-04-27	15-04-27
1.4.12 Seguridad física del centro de datos · comprobación	12-04-27	13-04-27
1.4.3 Entornos dedicados de la Filial y del Control de cruces ·…	12-04-27	13-04-27
1.4.11 Energía y climatización del centro de datos · comprobaci…	16-04-27	19-04-27
1.4.22 Equipamiento TI y redes de DC-01	16-04-27	04-05-27
1.4.2 Red de sitio y segmentación (25 sitios) · comprobación	24-04-27	07-05-27
H2 · Arquitectura aprobada	**07-05-27**	**07-05-27**
1.4.15 Tienda de laboratorio en Preproducción	02-06-27	07-06-27
1.4.17 Tres tiendas piloto instaladas (3)	02-06-27	11-06-27
1.4.2 Red de sitio y segmentación (25 sitios) · instalación fís…	08-06-27	15-06-27
1.4.23 Pila local de tienda (25 sitios) (4)	10-06-27	17-06-27
1.9.9 Prueba de corte de enlace de 24 h en el piloto	18-06-27	06-07-27
H3 · Infraestructura y ambientes	**07-07-27**	**07-07-27**

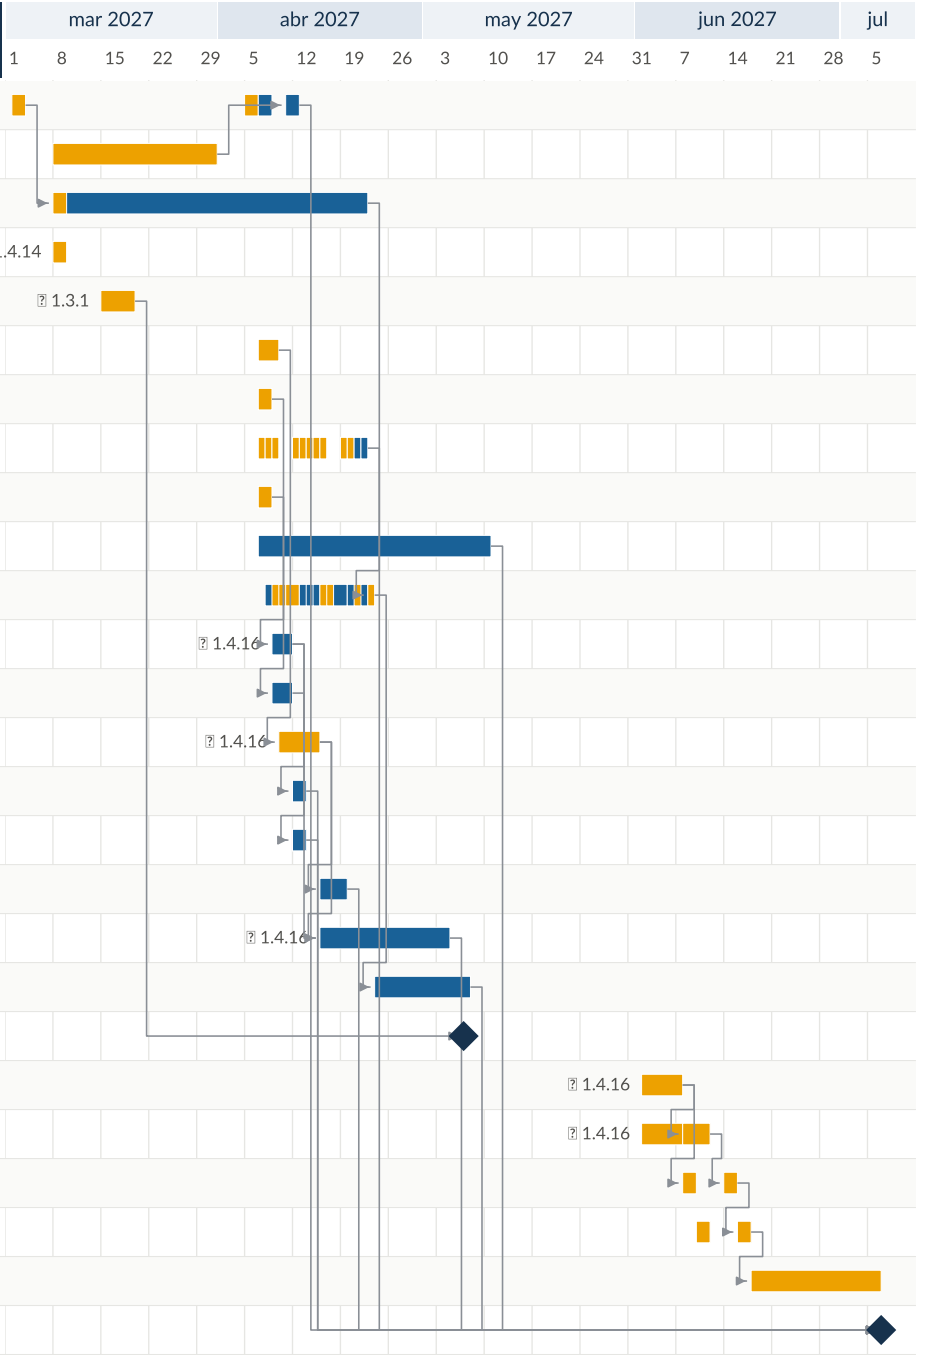

Holgura ≤ 10 días hábiles · Holgura > 10 días hábiles · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II) · Predecesora fuera de la vista
