Actividad	Inicio	Fin
Revisión del cliente de la certificación E2	06-06-28	19-06-28
Reserva para subsanar observaciones	22-06-28	06-07-28
H10 · Certificación E2	07-07-28	07-07-28
H11 · Inicio de marcha blanca E2	07-07-28	07-07-28
Marcha blanca E2: operación supervisada	07-07-28	06-09-28
Cuatro últimas semanas de evidencia	10-08-28	06-09-28
Revisión progresiva del expediente	24-08-28	06-09-28
Continuidad del servicio de la Etapa 1	07-01-28	06-09-28
H12 · Producción E2 y aceptación	07-09-28	07-09-28
Cartera: tramos T2 y T3 (fecha fija)	07-07-28	03-08-28

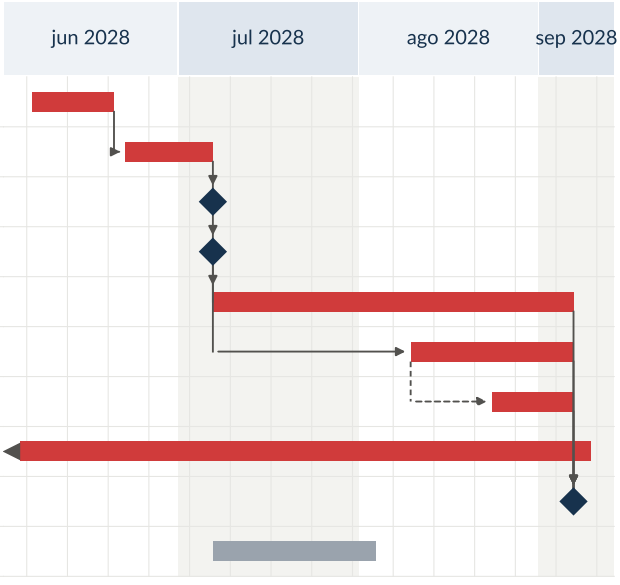

Ruta crítica (holgura 0) · Fecha fija, fuera de la ruta crítica · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II)
