ID	Actividad	Viene de	Sigue en	Inicio	Fin
1.6.6	Certificación de integraciones con conciliación	inicio de M10		08-05-28	31-05-28
1.8.6	Pruebas de intrusión y plan de remediación	inicio de M11		08-05-28	12-05-28
1.8.8	Atestación de cadena de suministro y confianza cero	inicio de M10		08-05-28	15-05-28
1.9.4	Pruebas de desempeño, resiliencia y DR	inicio de M11		08-05-28	11-05-28
1.9.6	Aceptación de los 28 criterios del caso	inicio de M11		22-05-28	02-06-28
1.14.3	Base de conocimiento y manuales de operación	inicio de M10		01-06-28	14-06-28
–	Revisión del cliente de la certificación E2			06-06-28	19-06-28
1.13.3	Capacitación ejecutada y certificada	inicio de M10		07-06-28	14-06-28
–	Reserva para subsanar observaciones E2			22-06-28	06-07-28
H10	**Certificación E2**		1.10.1.4, 1.10.1.7 y 6 más	**07-07-28**	**07-07-28**
H11	**Inicio de marcha blanca E2**		1.12.5, 1.13.4, 1.7.6, H12	**07-07-28**	**07-07-28**

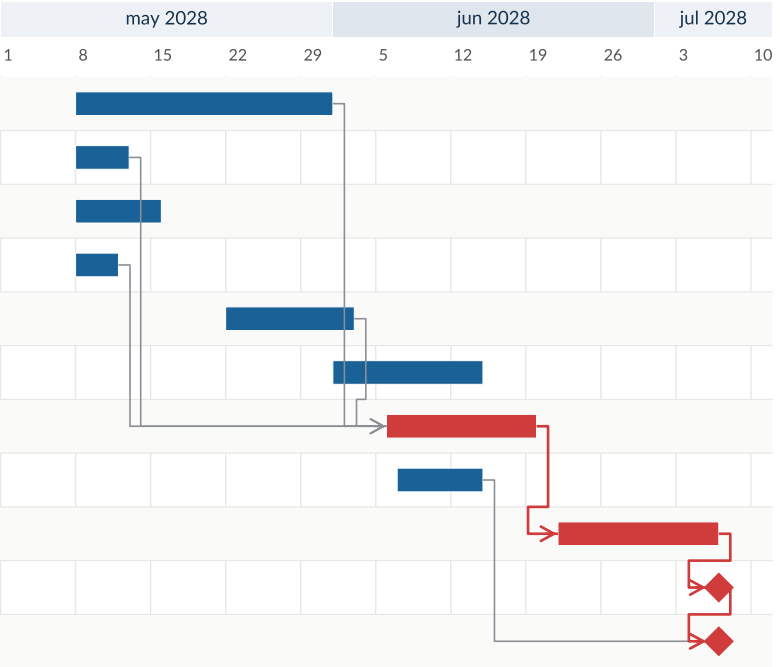

Ruta crítica · Fuera de la ruta crítica · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II)
