ID	Actividad	Viene de	Sigue en	Inicio	Fin
–	Versión candidata verificada (control)	1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3 y 79 más		01-10-27	01-10-27
1.6.6	Certificación de integraciones con conciliación	inicio de M10		07-10-27	03-11-27
1.10.2.4	Evaluación e integración del modelo predictivo	1.10.2.3, inicio de M9		07-10-27	21-10-27
1.13.3	Capacitación ejecutada y certificada	inicio de M10	H6	07-10-27	21-12-27
1.10.2.5	Pruebas por versiones del modelo	inicio de M9		22-10-27	29-10-27
H4	**Software E1 para pruebas**			**07-11-27**	**07-11-27**
1.7.3	Corte de inventario en 24 instalaciones (21)	1.7.2, inicio de M11		08-11-27	07-12-27
1.8.6	Pruebas de intrusión y plan de remediación	1.8.9, inicio de M11		08-11-27	12-11-27
1.9.4	Pruebas de desempeño, resiliencia y DR	inicio de M11		08-11-27	11-11-27
1.10.2.6	Certificación específica (junto con la certificación E1)	inicio de M11		08-11-27	11-11-27
1.9.6	Aceptación de los 28 criterios del caso	inicio de M11		22-11-27	03-12-27
1.14.4	Plan de reversibilidad	inicio de M1, inicio de M12		07-12-27	15-12-27
–	Revisión del cliente de la certificación E1			10-12-27	23-12-27
–	Reserva para subsanar observaciones E1			24-12-27	06-01-28
H5	**Certificación E1**		1.11.2, 1.7.3, 1.7.4 y 3 más	**07-01-28**	**07-01-28**

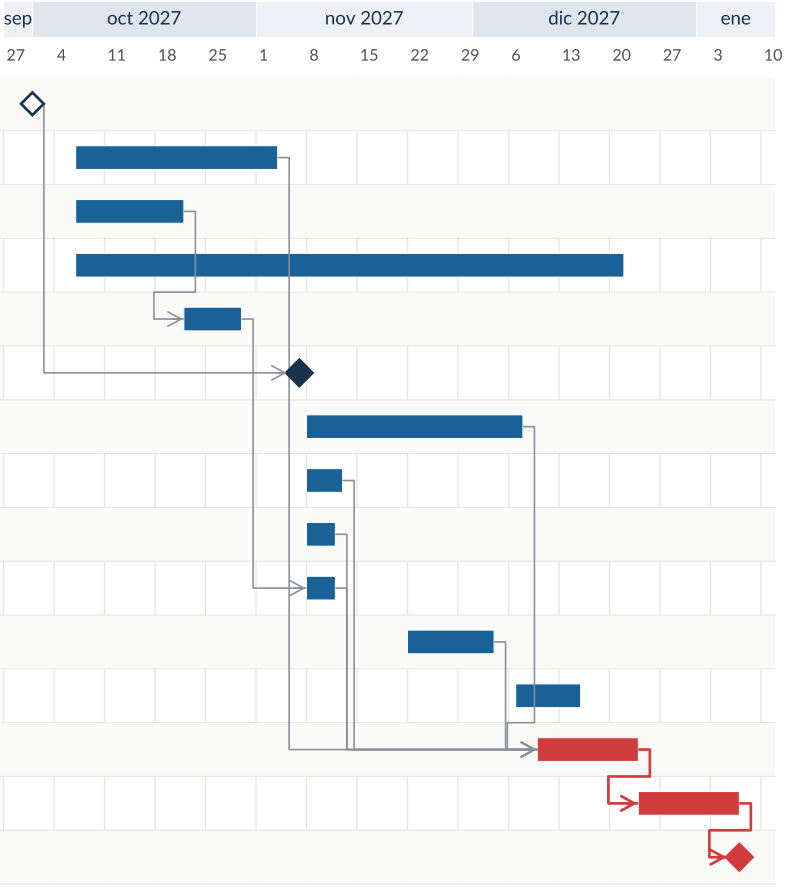

Ruta crítica · Fuera de la ruta crítica · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II)
