ID	Actividad	Viene de	Sigue en	Inicio	Fin
1.5	Desarrollo de software · diseño (44 paquetes)	inicio de E2	1.5.13.1 y 43 más	07-01-28	16-02-28
1.7.3	Corte de inventario en 24 instalaciones · intervención (18)	H5, inicio de M11	1.11.2, H7	07-01-28	23-01-28
1.7.3	Corte de inventario en 24 instalaciones · comprobación	inicio de M11	1.11.2, H7	24-01-28	06-02-28
1.7.4	Migración del histórico comercial · intervención	H5, inicio de M10	1.11.2, H7	07-01-28	08-01-28
1.7.4	Migración del histórico comercial · comprobación	inicio de M10	1.11.2, H7	10-01-28	11-01-28
1.7.7	Repositorio de datos históricos no migrados · intervención (9)	H5, inicio de M10	1.11.2, H7	07-01-28	24-01-28
1.7.7	Repositorio de datos históricos no migrados · comprobación	inicio de M10	1.11.2, H7	25-01-28	02-02-28
1.10.1.1	Diseño de la solución de lockers y de la credencial de retiro	inicio de M13	1.10.1, 1.10.1.2, 1.10.1.3	08-02-28	16-02-28
1.10.3.1	Diseño de la solución y contrato de datos	inicio de M13	1.10.3.2	08-02-28	16-02-28
1.10.4.1	Diseño de la red de medios y del modelo de campañas	inicio de M13	1.10.4.2, 1.10.4.3	08-02-28	16-02-28
1.10.5.1	Diseño del modo tienda y de la fila virtual	inicio de M13	1.10.5, 1.10.5.2, 1.10.5.3	08-02-28	16-02-28
1.10.2.7	Evaluación en sombra y aceptación E1	inicio de M13		12-02-28	15-02-28
H8	**Línea base y diseño E2**		1.13.3 y 44 más	**07-03-28**	**07-03-28**
1.9.5	Ensayo de degradación del evento anual	inicio de M15		07-03-28	08-03-28

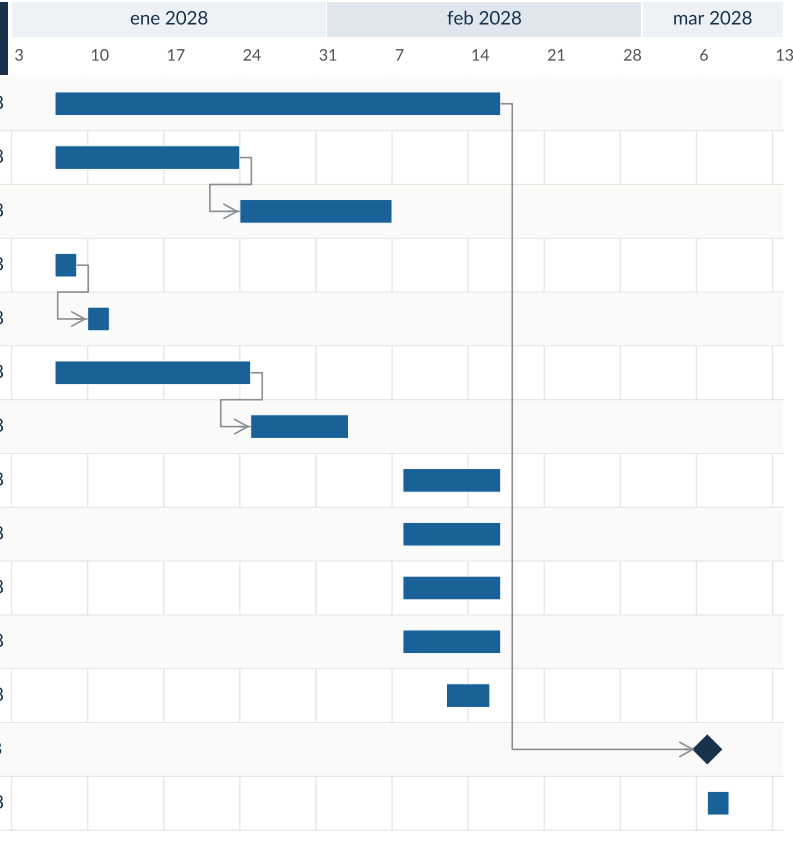

Actividad · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II)
