Rama 1.4 · Infraestructura híbrida y plataforma base (lámina 2 de 2)

Etapa 1 · Etapa 2 · Marcha blanca · Operación · Actividades sin margen

Código	Paquete o cuenta de control	HH	Ventana	Margen
1.4.13	Respaldo en operación con custodia de m…	135	M4–M4	44
1.4.14	Levantamiento físico de 25 sitios	407	M1–M3	8
1.4.15	Tienda de laboratorio en Preproducción	73	M5–M6	0
1.4.16	Suministro de DC-01 y del lote 1	33	M1–M3	0
1.4.17	Tres tiendas piloto instaladas	220	M5–M6	0
1.4.18	Suministro del lote 2 (19 tiendas y 2 C…	16	M5–M5	29
1.4.19	Instalación del lote 2	1.488	M7–M9	43
1.4.20	Recuperación en Brazil South completa	49	M9–M9	52
1.4.21	Plataforma de datos y analítica	325	M5–M5	113
1.4.22	Equipamiento TI y redes de DC-01	325	M4–M4	42
1.4.23	Pila local de tienda (25 sitios)	407	M6–M9	0
1.4.24	Replicación entre regiones	146	M7–M7	56

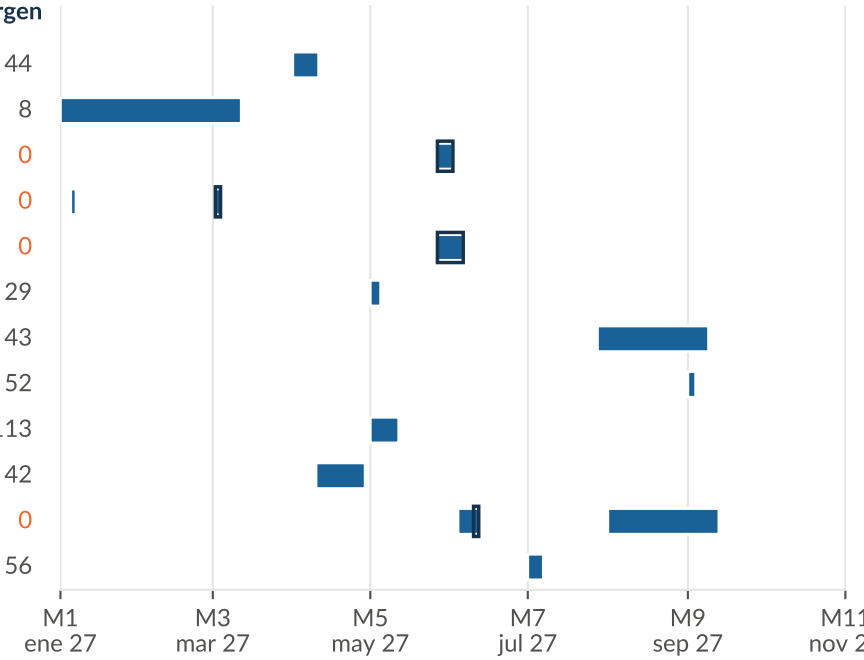

Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).
