Rama 1.6 · Integraciones

Etapa 1 · Etapa 2 · Marcha blanca · Operación · Actividades sin margen

Código	Paquete o cuenta de control	HH	Ventana	Margen
1.6.1	Catálogo de interfaces rediseñadas	61	M2–M2	73
1.6.2	Rediseño de las integraciones de la Eta…	1.188	M5–M9	11
1.6.3	Rediseño de las integraciones de la Eta…	660	M15–M16	16
1.6.4	Canal de intercambio con proveedores	488	M15–M16	16
1.6.5	Reportes a las autoridades fiscalizador…	325	M8–M8	99
1.6.6	Certificación de integraciones con conc…	448	M10–M17	3
1.6.7	Contingencia tributaria probada con ERP…	96	M4–M4	59

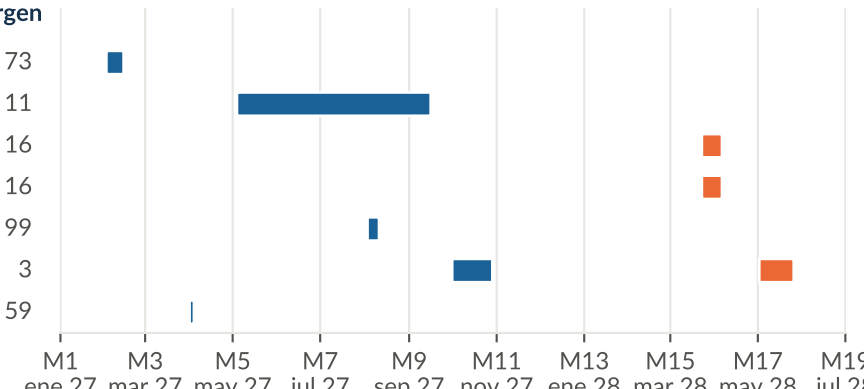

Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).
