## Rama 1.5 · Desarrollo de software (lámina 3 de 3)

Etapa 1 · Etapa 2 · Marcha blanca · Operación · Actividades sin margen

| Código | Paquete o cuenta de control | HH | Ventana | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.35 | Evaluación crediticia, apertura de tarj… | 932 | M7–M8 | 5 |
| 1.5.36 | Simulación del costo total del crédito … | 466 | M7–M8 | 2 |
| 1.5.37 | Autorización de compra a cuotas sin enl… | 699 | M7–M8 | 3 |
| 1.5.38 | Mora y gestión de cobranza | 466 | M7–M8 | 9 |
| 1.5.39 | Repactación, pagos y estado de cuenta | 699 | M7–M17 | 6 |
| 1.5.40 | Conciliación diaria y convivencia con l… | 466 | M7–M8 | 7 |
| 1.5.41 | Información precontractual entregada, a… | 699 | M7–M8 | 2 |
| 1.5.42 | Consentimiento de modificaciones de con… | 466 | M7–M8 | 6 |
| 1.5.43 | Reconstrucción y recuperación de la evi… | 466 | M7–M8 | 5 |
| 1.5.44 | Inventario de flujos de cruce autorizad… | 466 | M7–M8 | 4 |
| 1.5.45 | Rechazo de cruces no autorizados entre … | 466 | M7–M8 | 3 |
| 1.5.46 | Correspondencia de identificadores y ev… | 233 | M7–M8 | 2 |
| 1.5.47 | Identidad individual y administración d… | 466 | M3–M4 | 9 |
| 1.5.48 | Habilitación, revocación y conciliación… | 1.166 | M3–M4 | 6 |
| 1.5.49 | Orden de degradación y ventanas de cong… | 466 | M3–M4 | 4 |
| 1.5.50 | Plataforma de integración y convivencia… | 466 | M3–M4 | 3 |
| 1.5.51 | Observabilidad y capacidad analítica | 466 | M3–M4 | 2 |

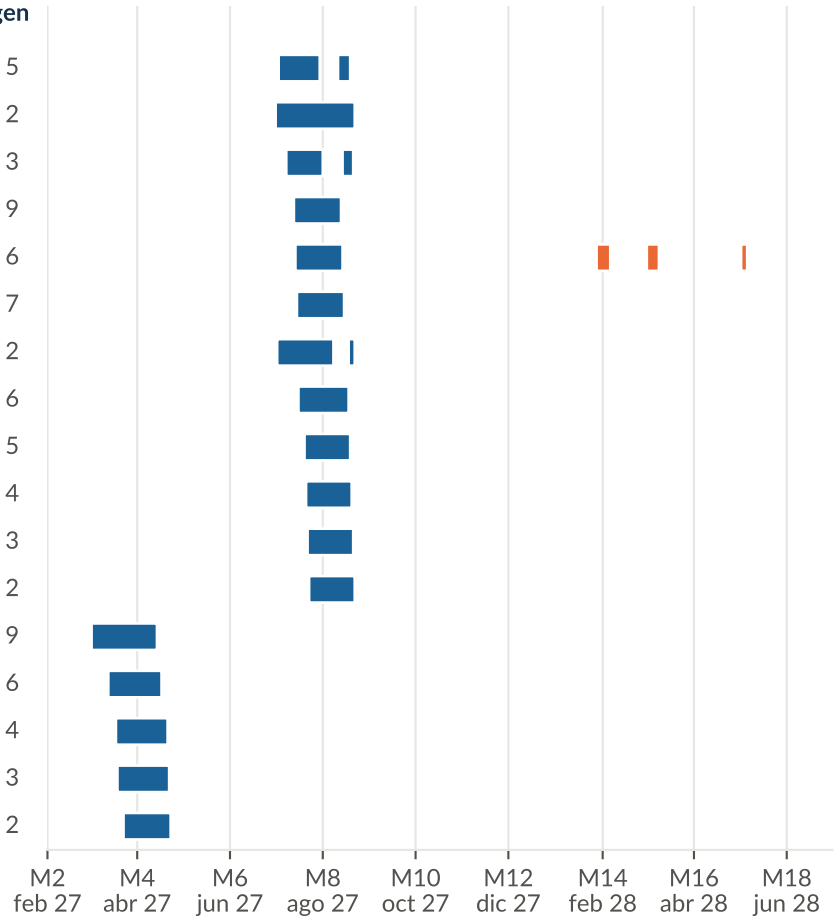


Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).
