Rama 1.9 · Calidad, pruebas y certificación

Etapa 1 · Etapa 2 · Marcha blanca · Operación · Actividades sin margen

Código	Paquete o cuenta de control	HH	Ventana	Margen
1.9.1	Plan de pruebas	32	M2–M2	60
1.9.2	Estándares de código y puertas de calid…	—	—	—
1.9.3	Batería de pruebas funcionales y no fun…	—	—	—
1.9.4	Pruebas de desempeño, resiliencia y DR	608	M11–M17	17
1.9.5	Ensayo de degradación del evento anual	261	M15–M27	21
1.9.6	Aceptación de los 28 criterios del caso	243	M11–M17	1
1.9.7	Certificación de calidad de la Etapa 1	—	—	—
1.9.8	Certificación de calidad de la Etapa 2	—	—	—
1.9.9	Prueba de corte de enlace de 24 h en el…	192	M6–M6	0
1.9.10	Evaluación de comercio electrónico y fi…	101	M9–M9	80
1.9.11	Pruebas de tareas del punto de venta	48	M5–M5	57
1.9.12	Pruebas de comprensión con clientes y t…	40	M12–M19	35

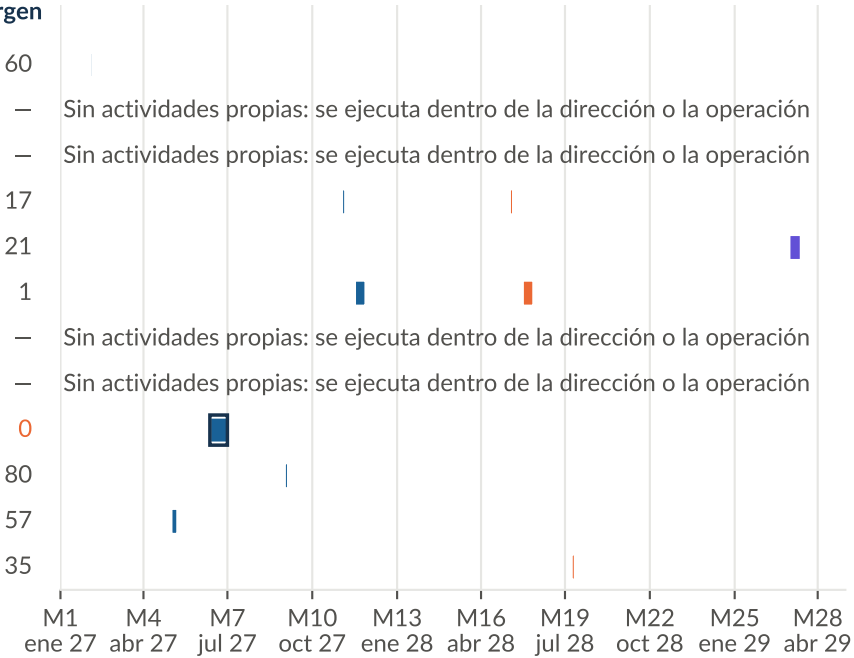

Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).
